



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA" PRIGNANO CILENTO (SA)

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 29/07/2021

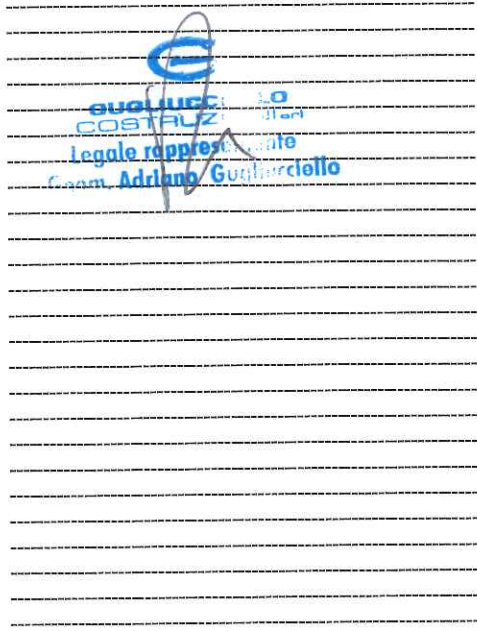
OGGETTO: FSC 2014 - 2020 POA - Infrastrutture irrigue
C.U.P. E54B12000120006 -
Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

IMPRESA: GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

Contratto in data 06/11/2020 rep.n. 507 registrato in data __/__/__ al n. dieuro
6 307 012.11

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	7 183 970.02
Data Consegna:	18/11/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/11/2020	Importo per la Sicurezza:	111 918.85
Giorni Utili per Ultimazione:	610	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/06/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	630 701.21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 6'195'093,26 - 100%)			
1 002.001.001	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Tubazioni			
	SOMMANO %		1'723	
	<i>aliquote</i>	46,460	228,29 (27,816%)	800'611,86 (12,923%)
2 002.001.002	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Lavori di sistemazione e movimentazione			
	SOMMANO %		2'204	
	<i>aliquote</i>	33,081	159,91 (35,579%)	729'158,14 (11,770%)
3 002.001.003	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte di distribuzione			
	SOMMANO %		691'451,73	78'189,36
	<i>aliquote</i>	11,308	(11,161%)	(1,262%)
4 002.001.004	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte terziarie			
	SOMMANO %		366'369,80	18'944,98
	<i>aliquote</i>	5,171	(5,914%)	(0,306%)
5 002.004.008	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - PROCEDURE ESPROPRIATIVE - Procedure espropriative			
	SOMMANO %		230'323,86	25'565,95
	<i>aliquote</i>	11,100	(3,718%)	(0,413%)
6 003.002.005	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con gabbioni			
	SOMMANO %		421'220,25	74'918,24
	<i>aliquote</i>	17,786	(6,799%)	(1,209%)
7 003.002.006	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con materassi			
	SOMMANO %		117'142,32	23'228,15
	<i>aliquote</i>	19,829	(1,891%)	(0,375%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			1'750'616,68 (28,258%)
				
	A RIPORTARE			1'750'616,68



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA" PRIGNANO CILENTO (SA)

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: FSC 2014 - 2020 POA - Infrastrutture irrigue
C.U.P. E54B12000120006 -
Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"


IMPRESA: GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Velia Ingegneria s.r.l. D.T. Ing. Gaetano Suppa

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
Direttore Tecnico
Ing. Gaetano Suppa

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 6'195'093,26 - 100%)					
1 002.001.001	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Tubazioni	1	1	25,245		435'028,98
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			25,245		435'028,98 (7,022%)
		2	9	21,215		365'582,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			46,460	1'723 228,29 (27,816%)	800'611,86 (12,923%)
2 002.001.002	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Lavori di sistemazione e movimentazione	1	3	13,661		301'110,29
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			13,661		301'110,29 (4,860%)
		2	10	19,420		428'047,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			33,081	2'204 159,91 (35,579%)	729'158,14 (11,770%)
3 002.001.003	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte di distribuzione	1	4	4,910		33'950,28
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			4,910		33'950,28 (0,548%)
		2	11	6,398		44'239,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			11,308	691'451,73 (11,161%)	78'189,36 (1,262%)
4 002.001.004	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte terziarie	1	5	0,514		1'883,14
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,514		1'883,14 (0,030%)
		2	12	4,657		17'061,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			5,171	366'369,80 (5,914%)	18'944,98 (0,306%)
5 002.004.008	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - PROCEDURE ESPROPRIATIVE - Procedure espropriative	1	2	11,100		25'565,95
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			11,100		25'565,95 (0,413%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			11,100	230'323,86 (3,718%)	25'565,95 (0,413%)
6 003.002.005	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con gabbioni	1	6	1,247		5'252,62
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			1,247		5'252,62 (0,085%)
		2	13	16,539		69'665,62
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % <i>aliquote</i>			17,786	421'220,25 (6,799%)	74'918,24 (1,209%)
7 003.002.006	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con materassi	1	7	9,996		11'709,55
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			9,996		11'709,55 (0,189%)
		2	14	9,833		11'518,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			19,829	117'142,32	23'228,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 SIC-001	<u>COSTI SICUREZZA</u>					
	La presente VOCE scaturisce dai soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere. Tali costi della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	1	8	13,148		12'857,9
	al S.A.L. n. 1			13,148		12'857,9
		2	15	15,111		14'777,6
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			28,259	97'794,18	27'635,6
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				27'635,6	
	TOTALE euro				1'778'252,3	
	Data, 10/09/2021					
	<p>Il Direttore dei Lavori Velia Ingegneria s.r.l. D.T. Ing. Gaetano Suppa VELIA INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l. Località Piano della Rocca 84060 Prignano Cilento (SA) Direttore Tecnico <i>Ing. Gaetano Suppa</i></p> 					



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO (SA)

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: FSC 2014 - 2020 POA - Infrastrutture irrigue
C.U.P. E54B12000120006 -
Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

IMPRESA: GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giancarlo Greco



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 6'195'093,26 - 100%)							
9 002.001.001 29/07/2021	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Tubazioni <i>(voce pari a euro 1'723'228,29 - 27,816% dei lavori a corpo)</i>					21,215		
	SOMMANO % aliquota					21,215 (5,901%)		
10 002.001.002 29/07/2021	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Lavori di sistemazione e movimentazione <i>(voce pari a euro 2'204'159,91 - 35,579% dei lavori a corpo)</i>					19,420		
	SOMMANO % aliquota					19,420 (6,909%)		
11 002.001.003 29/07/2021	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte di distribuzione <i>(voce pari a euro 691'451,73 - 11,161% dei lavori a corpo)</i>					6,398		
	SOMMANO % aliquota					6,398 (0,714%)		
12 002.001.004 29/07/2021	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OPERE DI LINEA - TUBAZIONE ED APPARECCHIATURE - Opere di linea condotte terziarie <i>(voce pari a euro 366'369,80 - 5,914% dei lavori a corpo)</i>					4,657		
	SOMMANO % aliquota					4,657 (0,275%)		
13 003.002.005 29/07/2021	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con gabbioni <i>(voce pari a euro 421'220,25 - 6,799% dei lavori a corpo)</i>					16,539		
	SOMMANO % aliquota					16,539 (1,125%)		
14 003.002.006 29/07/2021	OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - ATTRAVERSAMENTI ALVEI - Attraversamenti Alvei con materassi <i>(voce pari a euro 117'142,32 - 1,891% dei lavori a corpo)</i>					9,833		
	SOMMANO % aliquota					9,833 (0,186%)		
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							


GUGLIUCCIELLO
 COSTITUTTORE
 Leggere l'art. 10 del Piano
 Comm. Adriano Gugliucciello
 L'IMPRESA

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.
 Località Piano della Rocca
 84060 Prignano Cilento (SA)
 Direttore Tecnico
 Ing. Carlo Sapia
 IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

