CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023

Dati dell'intervento

Regione	**Campania**
Provincia	**Salerno**
Comuni	**Vallo della Lucania**
Stazione Appaltante	**Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania** Via Zaccaria Pinto,19 – Vallo della Lucania (SA)
Codice Unico Progetto (CUP)	**I16J20000170003**
Codice Identificativo Gara (CIG)	**BB2CA04E3F**
Lavori	*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020* - Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 2. **Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione** ***Lavori in Amministrazione Diretta***
Appaltatore	**Impresa Sansone Giuseppe via Puori – Novi Velia (SA)**
Contratto	**15/04/2026**
Importo contrattuale	**a misura**
Responsabile Unico del Procedimento	**Consorzio di Bonifica "Velia"** **Arch. Antonio Petrocelli**
Progettista	**Ing. Tonio Ruggiero**
Direttore tecnico dei Lavori	**Ing. Tonio Ruggiero**
Tempi di esecuzione	**giorni 14 dalla data di consegna dei lavori**

Progetto

Nomina del RUP
Con delibera Presidenziale n. 45 del 29.05.2025, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 52 del 04.07.2025, il Consorzio Velia ha nominato RUP l'Arch. Antonio Petrocelli in sostituzione dell'ing. Marcello Nicodemo.

Affidamento della Progettazione e Direzione dei lavori
Con contratto del 23/03/2026 è stato conferito l'incarico di progettazione e direzione tecnica dei lavori dei lavori in Amministrazione Diretta allo scrivente ing. Tonio Ruggiero.

Descrizione sintetica dell'intervento
Messa in opera di tubazione in PEAD mm.180/280 per circa ml.700 in agro dei Comuni di Vallo della Lucania, Moio della Civitella e Novi Velia.

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

Contratto di appalto

Contratto
In data 15.04.2024 fu stipulato con l'Impresa Sansone Giuseppe il Contratto di Appalto per la realizzazione dei lavori in trattazione.

Consegna, durata e ultimazione dei lavori

In data 15.04.2026 è avvenuta la consegna dei lavori come da correlato verbale allegato in cui è stato fissato il termine di ultimazione degli stessi per il 29.04.2026. Il verbale è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve. I lavori hanno avuto inizio in data 16.04.2026, successivamente sono stati sospesi nei giorni 22/23.04.2026 e nei giorni dal 28/04/2026 a tutto il

17/05/2026 come da allegati verbali e sono terminati in data 21.05.2026, nel rispetto, considerato i giorni di sospensione, di quanto stabilito nel contratto di appalto.

Prove e collaudi parziali condotti in corso d'opera

Sono state eseguite le seguenti prove idrauliche:

- tratto Vallo della Lucania in data 18/04/2026
- tratto Moio della Civitella in data 21/04/2026
- tratto Novi Velia in data 20/05/2026

che hanno dato tutte esito positivo e si allegano al presente certificato.

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze delle visite sopra riferite, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

considerato che:

- i lavori eseguiti dall'Appaltatore corrispondono a quelli indicati nel Contratto e nei relativi atti contabili;
- i medesimi sono stati eseguiti con materiali idonei e a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti o comunque concordati;
- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 25.974,00 oltre IVA e perciò rientra nell'importo contrattuale;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti.

L'Ente Committente potrà liquidare all'Appaltatore l'importo di € 25.974,00 (diconsi euro venticinquemilanovecentosettantaquattro/00) oltre IVA salvo l'approvazione del presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 D. Lgs. 36/2023 – All. II.14 art. 9, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Vallo della Lucania, 23.05.2026

Il Direttore Tecnico dei Lavori in Amministrazione Diretta
Ing. Tonio Ruggiero

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. RUGGIERO TONIO N. 7374 SEZ. A Civile ed Ambientale

L'Appaltatore
Giuseppe Sansone

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

Visto: il R.U.P. – **Arch. Antonio Petrocelli**

Allegati

Verbale di consegna dei lavori- Verbali di sospensione (2) - Verbali di prova idraulica (3)- Stato finale dei lavori.

TONIO RUGGIERO
ingegnere

LAVORI: MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG BB2CA04E3F – LAVORZIONI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
COMMITTENTE: Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario – Vallo della Lucania
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Antonio Petrocelli
IMPRESA: Sansone Giuseppe via Puori – Novi Velia (SA) partita iva 03814130658

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

Visto il progetto dei lavori sopra indicati redatto dal sottoscritto;

Vista la Deliberazione Presidenziale del 07/04/2026 con la quale veniva disposto l'affidamento dei lavori all'impresa Sansone Giuseppe;

Visto il contratto per l'esecuzione dei lavori sottoscritto in data 15/04/026 dall'impresa e dalla committenza;

Previa Autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto;

Previo avviso all'Impresa appaltatrice,

l'anno 2026 il giorno 15 del mese di aprile presso la sede del Consorzio Irriguo in Vallo della Lucania, il sottoscritto Ing. Tonio Ruggiero iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia de Salerno al numero 7374/A, in qualità di Direttore Tecnico Operativo dei Lavori, alla presenza del Sig. Giuseppe Sansone, titolare della omonima Impresa appaltatrice dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori.
Accertato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori per i tratti accessibili ricadenti su di essa:
- ha designato i lavori da eseguire;
- ha dato indicazioni delle aree oggetto di intervento;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'appaltatore, fornito già di copia del contratto e di relativo elaborato tecnico-descrittivo, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n.14 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 29/04/2026

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Movimento Terra
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658 - C.F. SNSGPP83L09L628Z

Il Direttore Tecnico Operativo

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing.
RUGGIERO TONIO
N. 7374 SEZ. A
Civile ed Ambientale

Via Stefano Passero, 71 84078 Vallo della Lucania (SA) – Tel. +39 0974 72897 – Cell. +39 3357817152
email: costruzioniruggiero@gmail.com – C.F. RGGTNO 63H20 F278 A – P.I. 04538470651

TONIO RUGGIERO
ingegnere

Lavori:MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003- ATTIVITA' IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Spett.le Impresa Sansone Giuseppe
Via Puori
84060 Novi Velia (SA)

E p.c. Arch. Antonio Petrocelli
Responsabile Unico del Procedimento

Oggetto: Sospensione dei lavori.

In riferimento ai lavori in oggetto:

atteso che:

- alla data odierna risulta terminato il tratto in agro di Moio della Civitella;
- i lavori stanno proseguendo nel tratto in agro di Novi Velia;
- in tale tratto è prevista la posa in opera di una tubazione in PEAD diametro mm.180 fornito dalla committenza;
- che per un ritardo imputabile all'azienda fornitrice l'arrivo della fornitura è previsto per il giorno 23/04/206;

considerato che:

- non è possibile operare in altro tratto della condotta,

si dispone il fermo delle lavorazioni a tutto il 23/04/2026 con perentoria ripresa il giorno 24/04/2026.

Vallo della Lucania 21/04/2026

Il Direttore Tecnico Operativo

Ing. Tonio Ruggiero

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. RUGGIERO TONIO N. 7374 Sez. A Civile ed Ambientale

Via Stefano Passero, 71 84078 Vallo della Lucania (SA) – Tel. +39 0974 72897 – Cell. +39 3357817152
email: costruzioniruggiero@gmail.com – C.F. RGGTNO 63H20 F278 A – P.I. 04538470651

TONIO RUGGIERO
ingegnere

Lavori:MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003- ATTIVITA' IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Spett.le Impresa Sansone Giuseppe
Via Puori
84060 Novi Velia (SA)

E p.c. Arch. Antonio Petrocelli
Responsabile Unico del Procedimento

Oggetto: Sospensione dei lavori.

In riferimento ai lavori in oggetto:

atteso che:

-
- i lavori stanno proseguendo nel tratto in agro di Novi Velia;
- in tale tratto è prevista la posa in opera di una tubazione in PEAD diametro mm.180 fornito dalla committenza compreso i pezzi speciali di collegamento;
- che per un ritardo imputabile all'azienda fornitrice risultano ancora mancanti alcuni pezzi speciali di collegamento la cui consegna è prevista per il giorno 16/05/2026,

considerato che:

- non è possibile operare in altro tratto della condotta,

si dispone il fermo delle lavorazioni a tutto il 17/05/2026 con perentoria ripresa il giorno 18/05/2026.

Vallo della Lucania 27/04/2026

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. RUGGIERO TONIO N. 7374 Sez. A Civile ed Ambientale

Il Direttore Tecnico Operativo
Ing. Tonio Ruggiero

Via Stefano Passero, 71 84078 Vallo della Lucania (SA) – Tel. +39 0974 72897 – Cell. +39 3357817152
email: costruzioniruggiero@gmail.com – C.F. RGGTNO 63H20 F278 A – P.I. 04538470651

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003- ATTIVITA' IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Verbale delle operazioni di prova del tratto di condotta in agro di Vallo della Lucania per una lunghezza di ml. 308.

L'anno 2026 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 8,00 presso il cantiere di Vallo della Lucania in località Piana Pezina sono presenti:

- **Ing. Tonio Ruggiero** progettista e Direttore Tecnico dei Lavori
- **Geom. Angelo Sottolano** tecnico del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
- **Sig. Giuseppe Sansone** responsabile tecnico dell'omonima impresa appaltatrice dei lavori.

Si prende visione della tubazione in PEAD mm.280 posata su 2 tratti per ml.308,00 con n° 26 giunti saldati e collegata alla linea esistente con n°6 giunti flangiati e un raccordo a T 280/110. Viene effettuata la manovra di apertura della linea che rimane in funzione per 60 minuti e vengono controllati sia i giunti saldati che i giunti flangiati. Si rileva che nessuna perdita è presente lungo la linea pertanto il Direttore Tecnico ritiene terminata con esito positivo la prova e dispone il rinterro completo del tratto di condotta. Si allega planimetria dei luoghi di intervento. Le operazioni terminano alle ore 11,00.

Ing. Tonio Ruggiero

Geom. Angelo Sottolano


Sig. Giuseppe Sansone

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

Vallo della Lucania 18/04/2026


Inquadramento su ortofoto (scala 1:1000)
Stralcio di progetto - (Elaborato "F1g Planimetria di progetto - Quadrante G")
Vallo della Lucania - Comizio 10 (2 di 2). Tubazione in PEAD DN280

Allegato 3

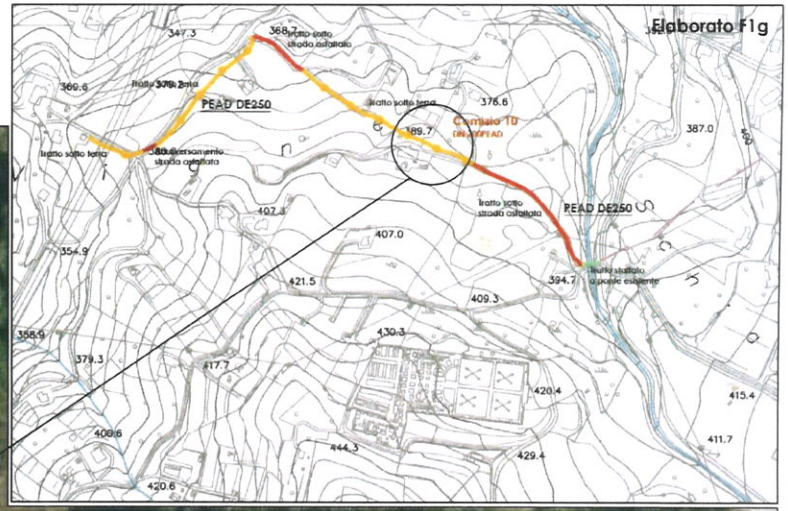

Inquadramento su ortofoto (scala 1:1000)
Stralcio di progetto - (Elaborato "F1g Planimetria di progetto - Quadrante G")
Vallo della Lucania - Comizio 10 (1di 2). Tubazione in PEAD DN280

Allegato 3

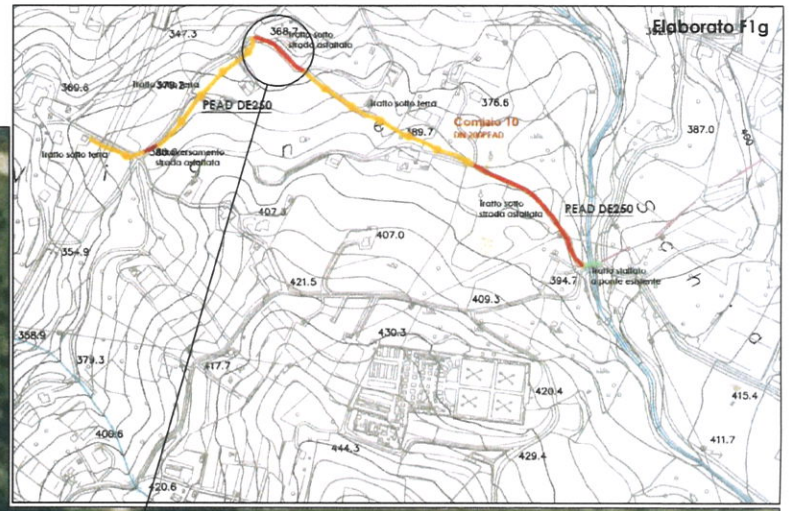

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003- ATTIVITA' IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Verbale delle operazioni di prova del tratto di condotta in agro di Moio della Civitella per una lunghezza di ml. 102.

L'anno 2026 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 9,00 presso il cantiere di Moio della Civitella in località Vetrali sono presenti:

- **Ing. Tonio Ruggiero** progettista e Direttore Tecnico dei Lavori
- **Geom. Angelo Sottolano** tecnico del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
- **Sig. Giuseppe Sansone** responsabile tecnico dell'omonima impresa appaltatrice dei lavori.

Si prende visione della tubazione in PEAD mm.280 posata per ml.102,00 con n° 9 giunti saldati e collegata alla linea esistente con n°2 giunti flangiati. Viene effettuata la manovra di apertura della linea che rimane in funzione per 60 minuti e vengono controllati sia i giunti saldati che i giunti flangiati. Si rileva che nessuna perdita è presente lungo la linea pertanto il Direttore Tecnico ritiene terminata con esito positivo la prova e dispone il rinterro completo del tratto di condotta. Si allega planimetria dei luoghi di intervento.
Le operazioni terminano alle ore 11,30.

Ing. Tonio Ruggiero

Geom. Angelo Sottolano

Sig. Giuseppe Sansone

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

Moio della Civitella 21/04/2026

Inquadramento su ortofoto (scala 1:1000)
Tratto aggiuntivo in sostituzione della rete esistente.
Moio della Civitella - Comizio 16. Tubazione in PEAD DN280

Allegato 1



MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003- ATTIVITA' IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Verbale delle operazioni di prova del tratto di condotta in agro di Novi Velia per una lunghezza di ml. 292.

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 14,00 presso il cantiere di Novi Velia in località Venturella sono presenti:

- **Ing. Tonio Ruggiero** progettista e Direttore Tecnico dei Lavori
- **Geom. Angelo Sottolano** tecnico del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
- **Sig. Giuseppe Sansone** responsabile tecnico dell'omonima impresa appaltatrice dei lavori.

Si prende visione della tubazione in PEAD mm.180 posata per ml.292,00 con n° 25 giunti saldati e collegata alla linea esistente con n°2 giunti flangiati. Viene effettuata la manovra di apertura della linea che rimane in funzione per 60 minuti e vengono controllati sia i giunti saldati che i giunti flangiati. Si rileva che nessuna perdita è presente lungo la linea pertanto il Direttore Tecnico ritiene terminata con esito positivo la prova e dispone il rinterro completo del tratto di condotta. Si allega planimetria dei luoghi di intervento.
Le operazioni terminano alle ore 20,00.

Ing. Tonio Ruggiero — Geom. Angelo Sottolano — Sig. Giuseppe Sansone

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. RUGGIERO TONIO N. 7374 SEZ. A Civile ed Ambientale


DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z


Vallo della Lucania 20/05/2026

Inquadramento su ortofoto (scala 1:1000)
Stralcio di progetto - (Elaborati F1c-F1g "Planimetria di progetto - Quadrante C-G")
Novi Velia - Comizio 17. Tubazione in PEAD DN180

Allegato 2



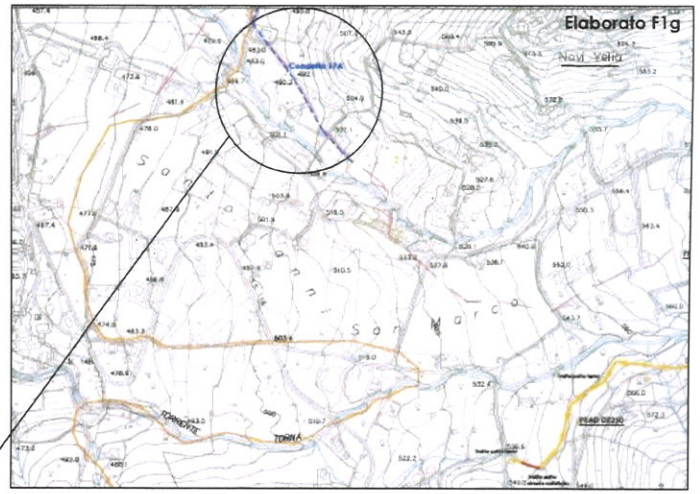

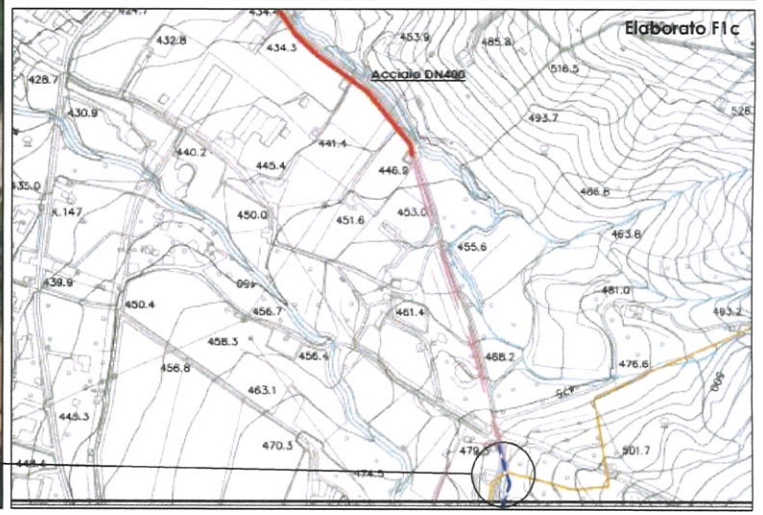

Comune di Vallo Della Lucania
Provincia di Salerno

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG BB2CA04E3F - Lavori in Amministrazione Diretta-

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: Impresa Edile di Sansone Giuseppe, Via Puori, SNC 84060 Novi Velia (SA)

Contratto in data 14/04/2026 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 25 974.00

Data Offerta:	26/03/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	25 974.00
Data Consegna:	15/04/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/04/2026	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	14	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/05/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 N.001	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il ... 16 Diametro esterno da 180 mm a 280, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO ml	702,00	37,00	25'974,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			25'974,00
	T O T A L E euro			25'974,00

SANSONE GIUSEPPE
RESA EDILE E STRADALE
Via Pitori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro			25'974,00
	PER LAVORI A MISURA euro		25'974,00
	T O T A L E euro		25'974,00

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

	A RIPORTARE

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	25'974,00
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	25'974,00

Data, 21/05/2026

DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658
C.F. SNSGPP83L09L628Z

L'Impresa
Impresa Edile Sansone Giuseppe

Il Direttore dei Lavori
Ing. Tonio Ruggiero

Dott. Ing. RUGGIERO TONIO n. 1574 SEZ. A Ordine degli Architetti PROVINCIA DI SALERNO

	A RIPORTARE			
